


Frage 1

hanseWasser



Waller Heerstraße




Kanalbaumaßnahme Waller Heerstraße hanseWasser

- Länge der Kanalbaumaßnahme ca. 900 m.
- Vorhandener Kanal gemauerte Eiprofil mit den Abmessungen:
- Breite 800mm und Höhe 1200mm bis B= 1160 und H= 1500mm
 - Baujahr 1928
 - Tiefe: 3,15 – 5,61 m
- Renovierung des vorhandenen Kanals mittels Schlauchliner.
- 142 Stück Anschlussleitungen werden erneuert bzw. renoviert.
- 17 Schachtbauwerke müssen saniert werden.
- 440m provisorische, oberirdische Leitung DN 800 für bis zu 1100 l/s Abwasser, einschl. Rohrbrücke über BSAG-Oberleitung.
- ca. 1700m Rinnensanierung mit der Erneuerung von 63 Rostenkästen.
- Dauer der Kanalarbeiten: Anfang März bis Ende Juli 2015, incl. Rinnenerneuerung
- Im Anschluss daran erfolgen die Arbeiten der BSAG.

- Die Tiefe und Verlauf des vorhandenen Sammlers
 - erzwingt grabenlose Bauweise in der Waller Heerstraße
 - ermöglicht Neubau des Sammlers im Pastorenweg
- Die hydraulische Bedeutung des Sammlers
 - erfordert ein oberirdisches Ersatzsystem zur Abwasserableitung vor Beginn der grabenlosen Bauweise
- Der Kanalbau
 - wird vor dem Gleisneubau notwendig
 - beinhaltet auch erste Arbeiten (Neubau der Rinnen) zur Straßenerneuerung für das Amt für Straßen und Verkehr

Ersatzleitung im Bereich Waller Straße hanseWasser

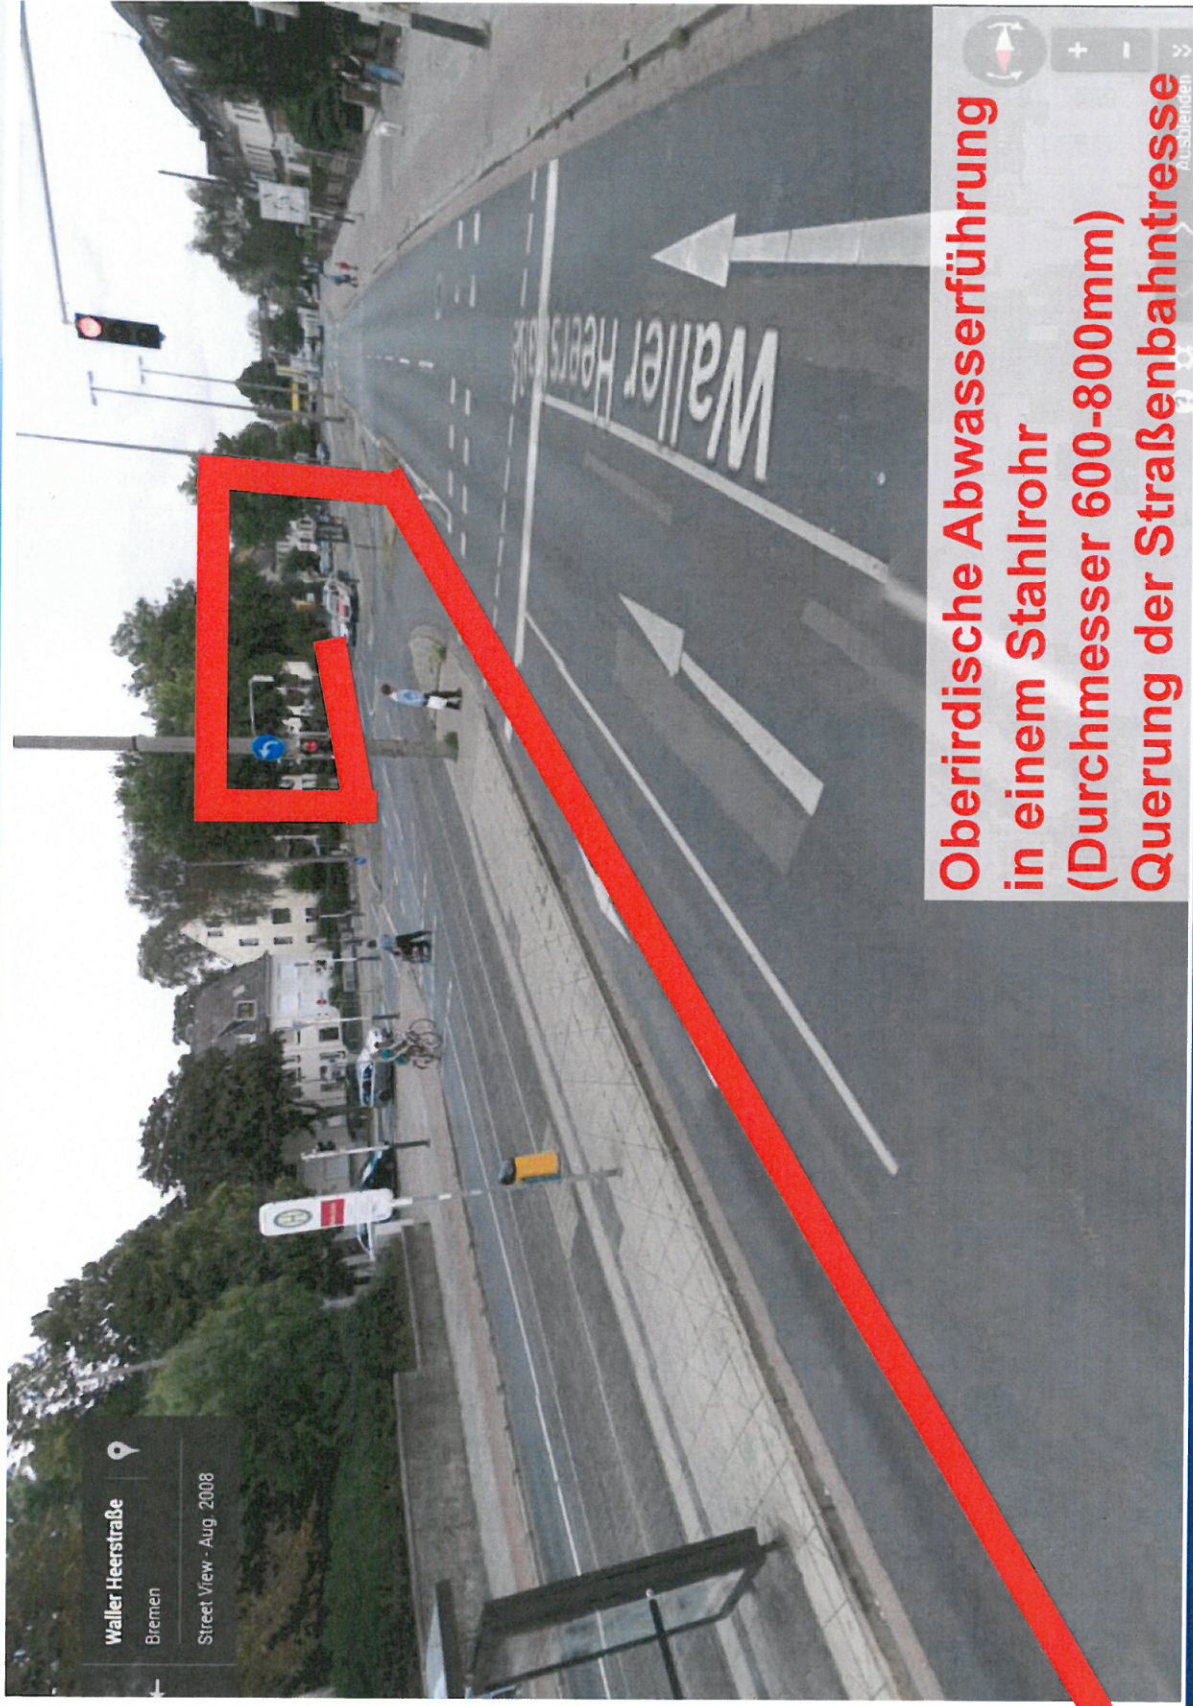

Bauabschnitt 1: Ackerstraße - Waller Heerstraße 213

Bauabschnitt 2: Waller Heerstr. 213 - Travemünder Straße

Bauabschnitt 3: Waller Ring - Travemünder Straße

160m Ei-Profil: 800/1200mm

220m Ei-Profil: 1080/1400mm

240m Ei-Profil: 1160/1500mm

280m Ei-Profil: 800/1200mm


geplante Terminschiene:

hanseWasser


Bauabschnitt 1 : 09.03.2015 – 26.05.2015

Bauabschnitt 3 : 09.03.2015 – 13.05.2015⁹


Bauabschnitt 2 : 27.04.2015 – 31.07.2015

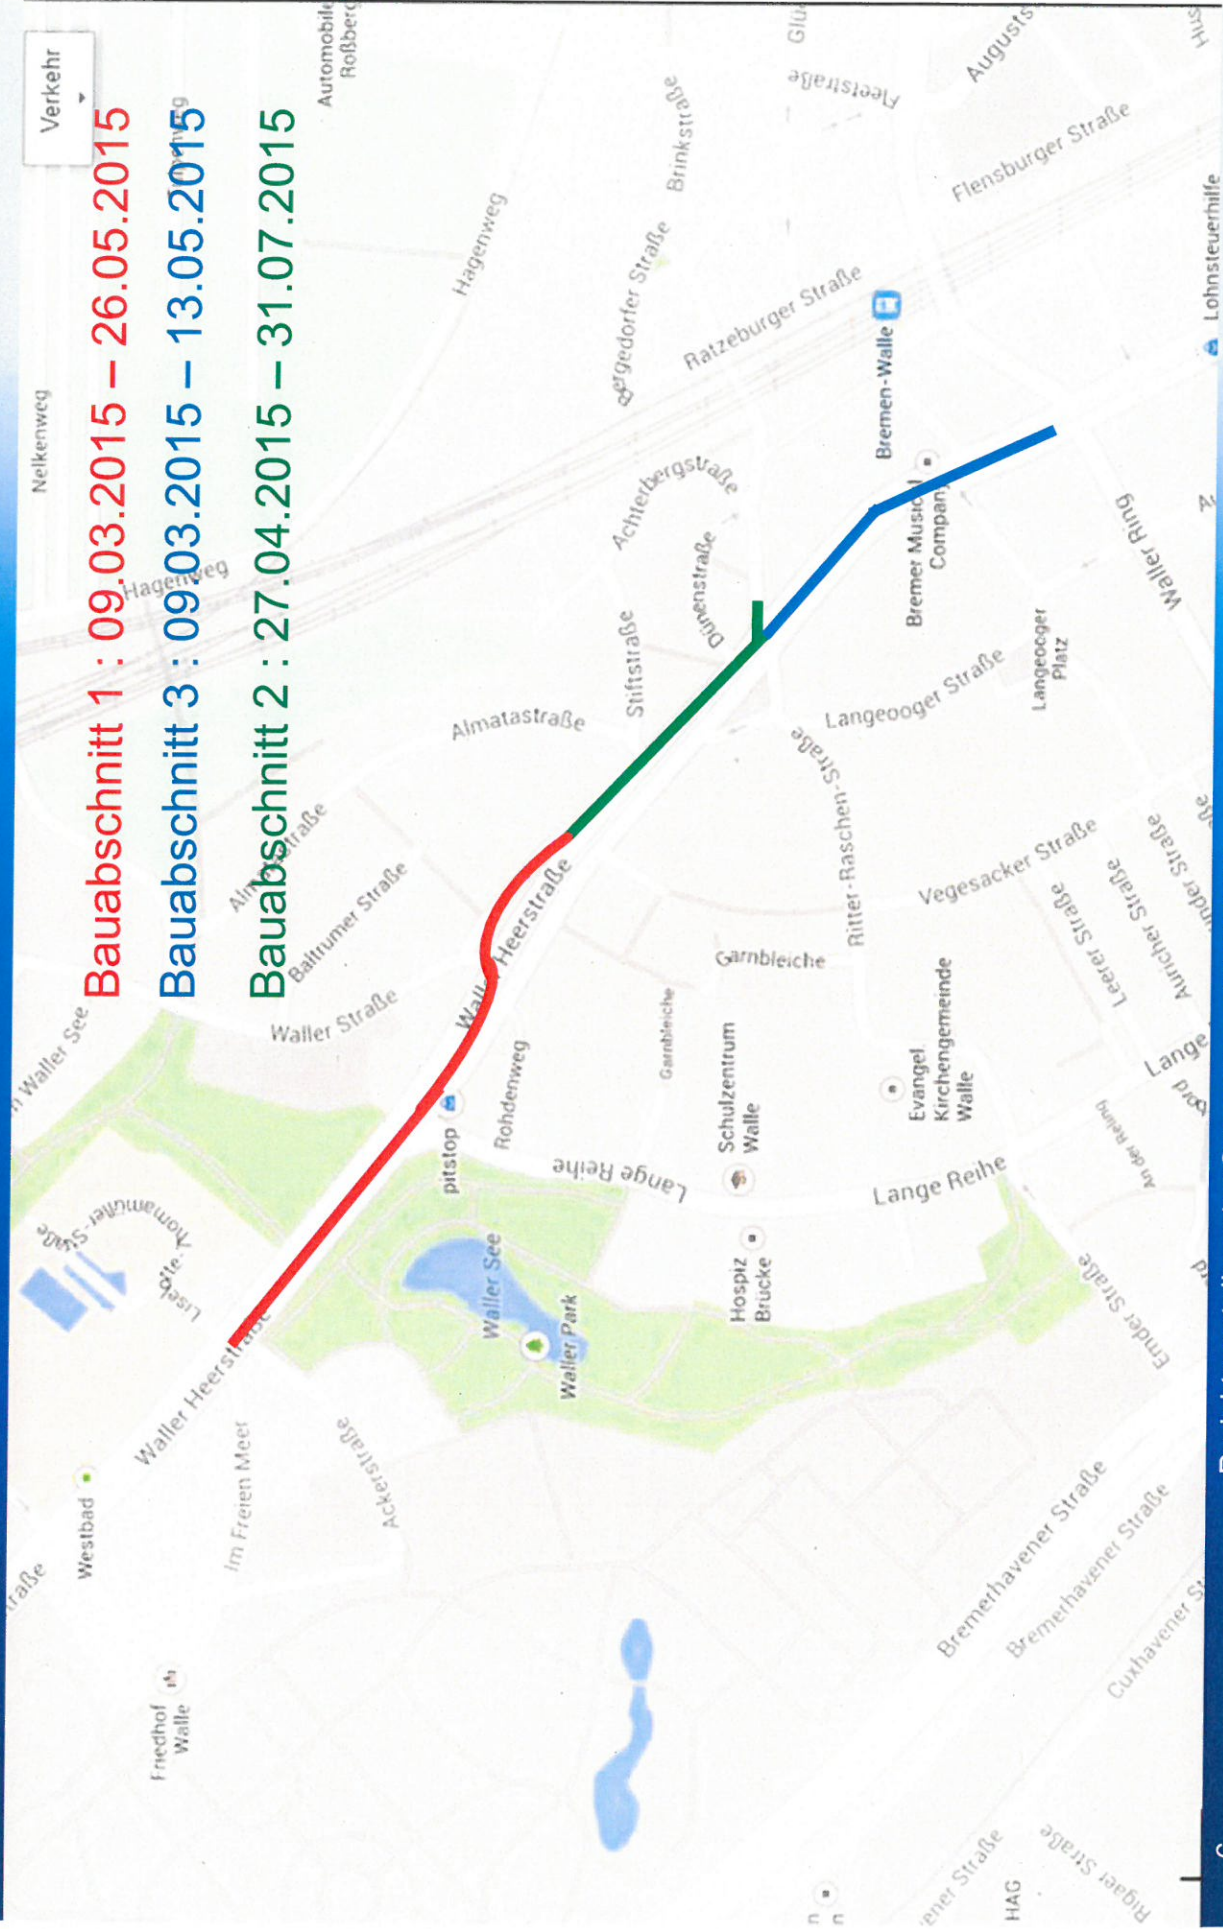


Verkehrslenkung 09.03.15. – 26.04.15 hanseWasser

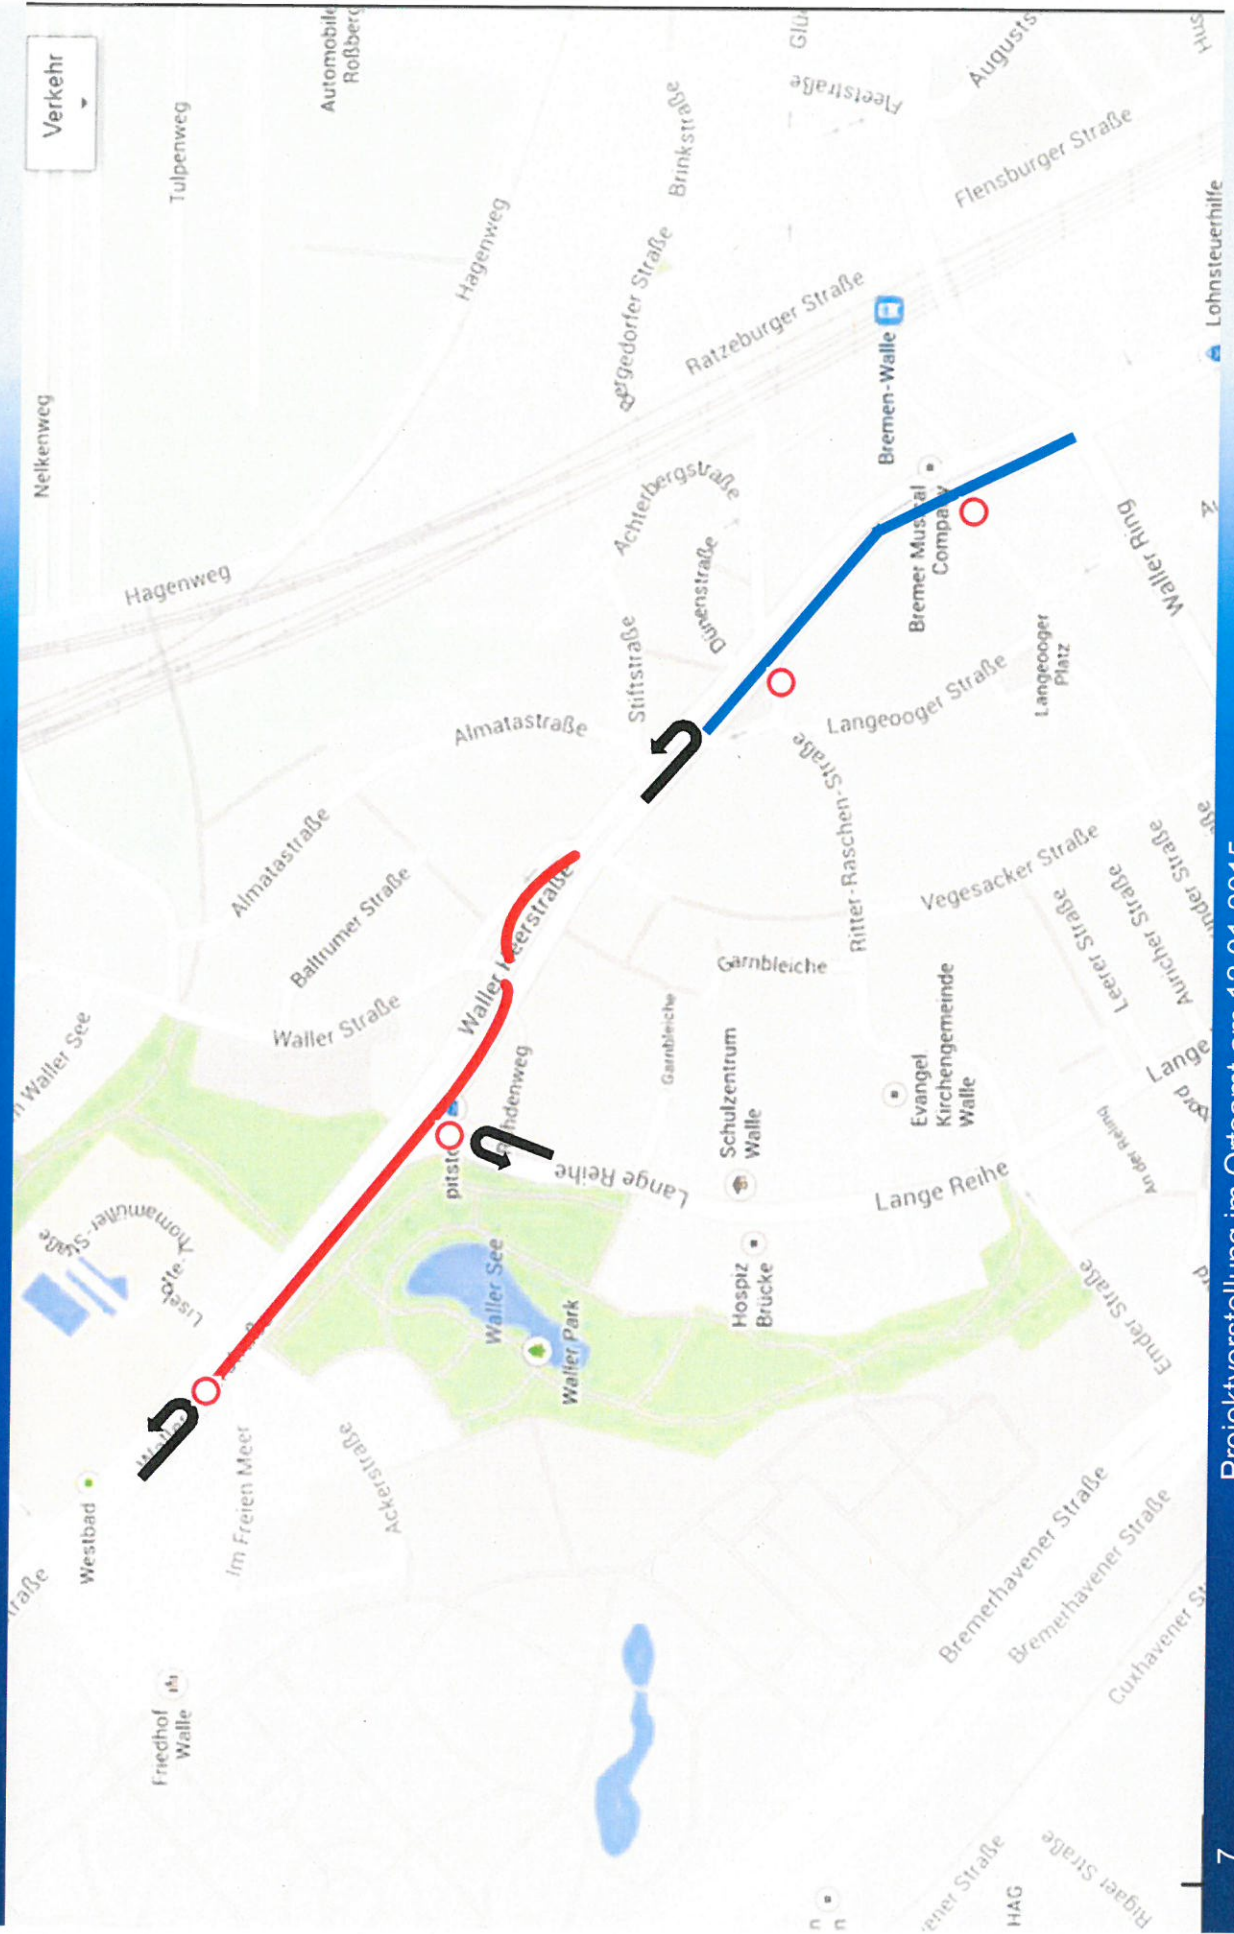


Verkehrslenkung 27.04.15. – 13.05.15 hanseWasser

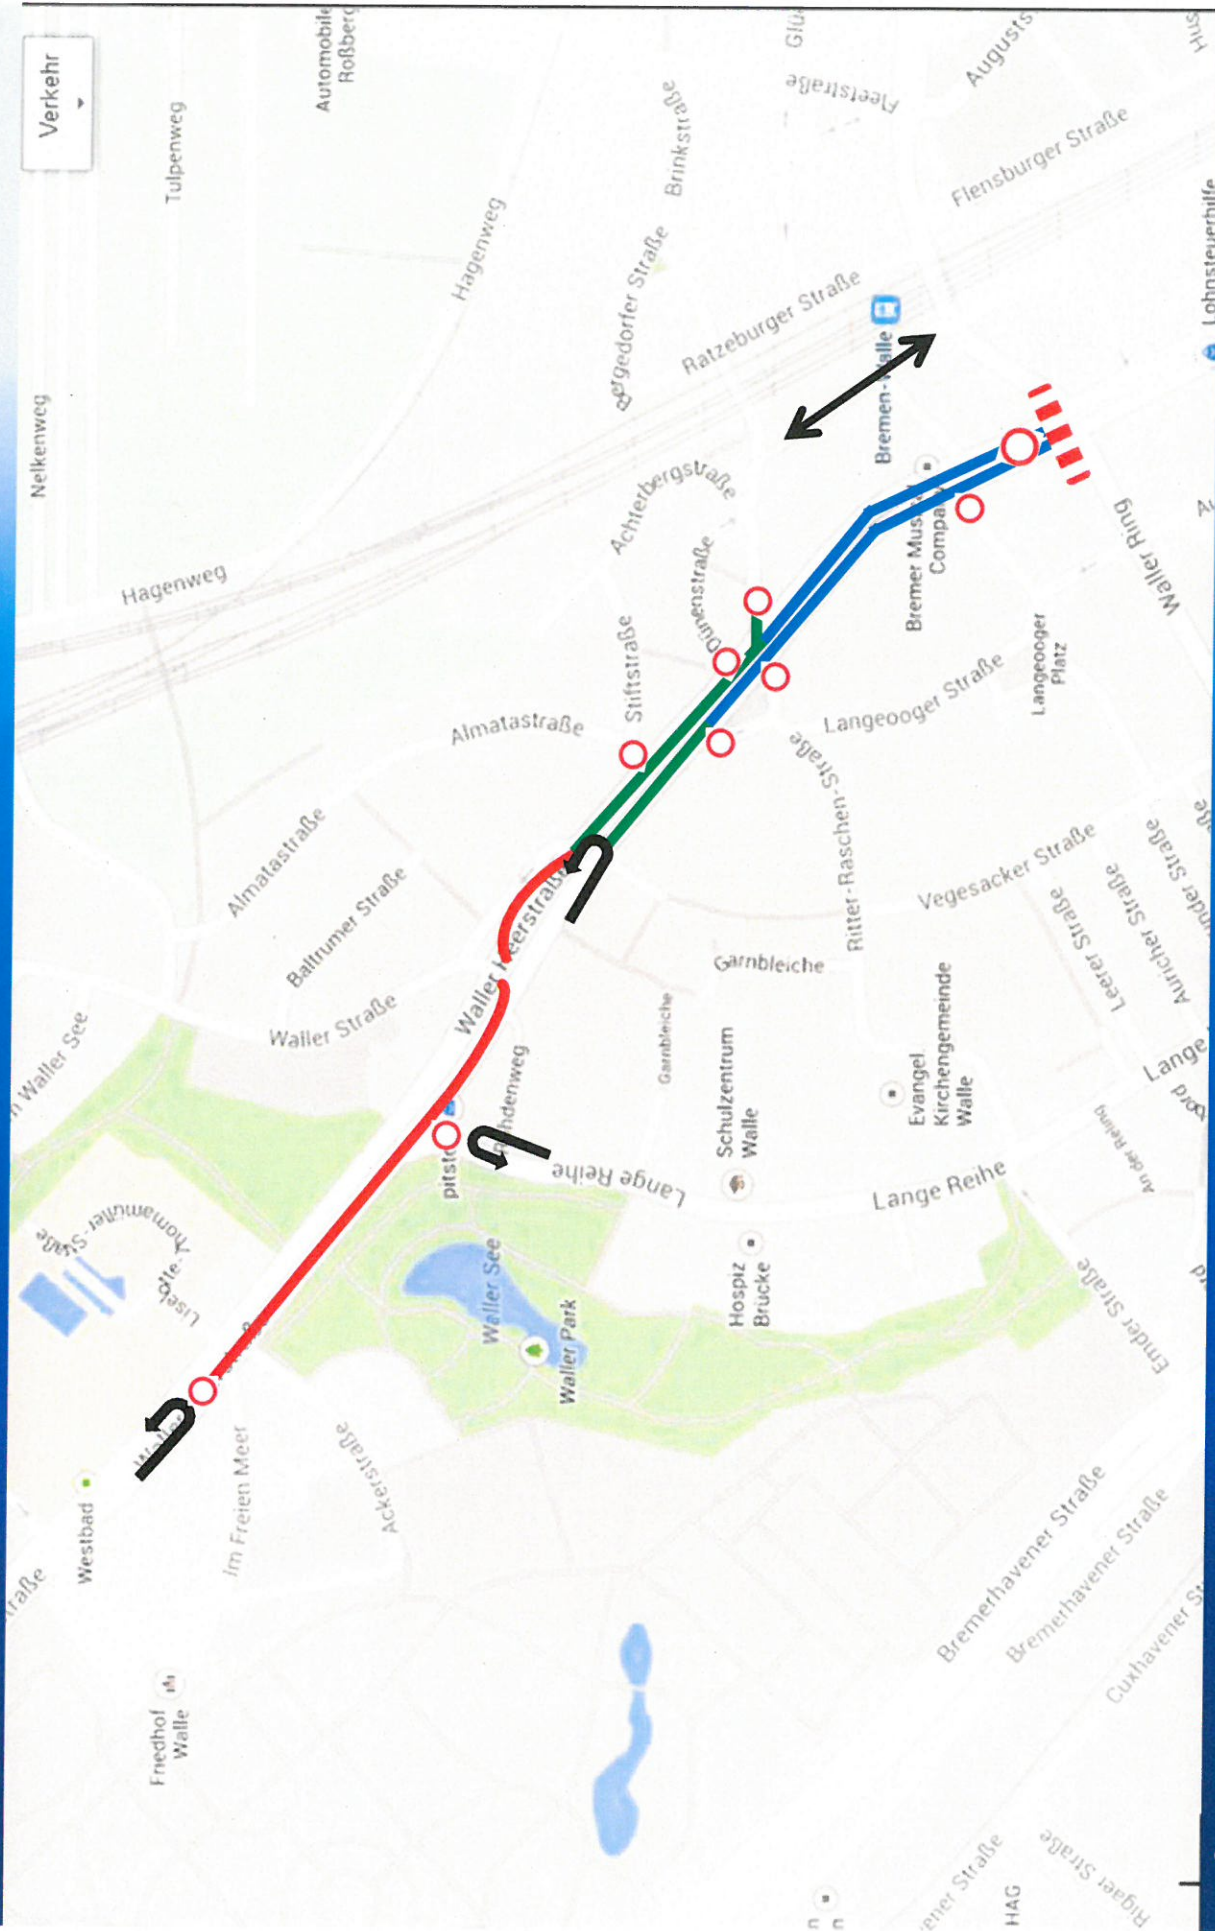

Verkehrslenkung 14.05.15. – 26.05.15 hanseWasser

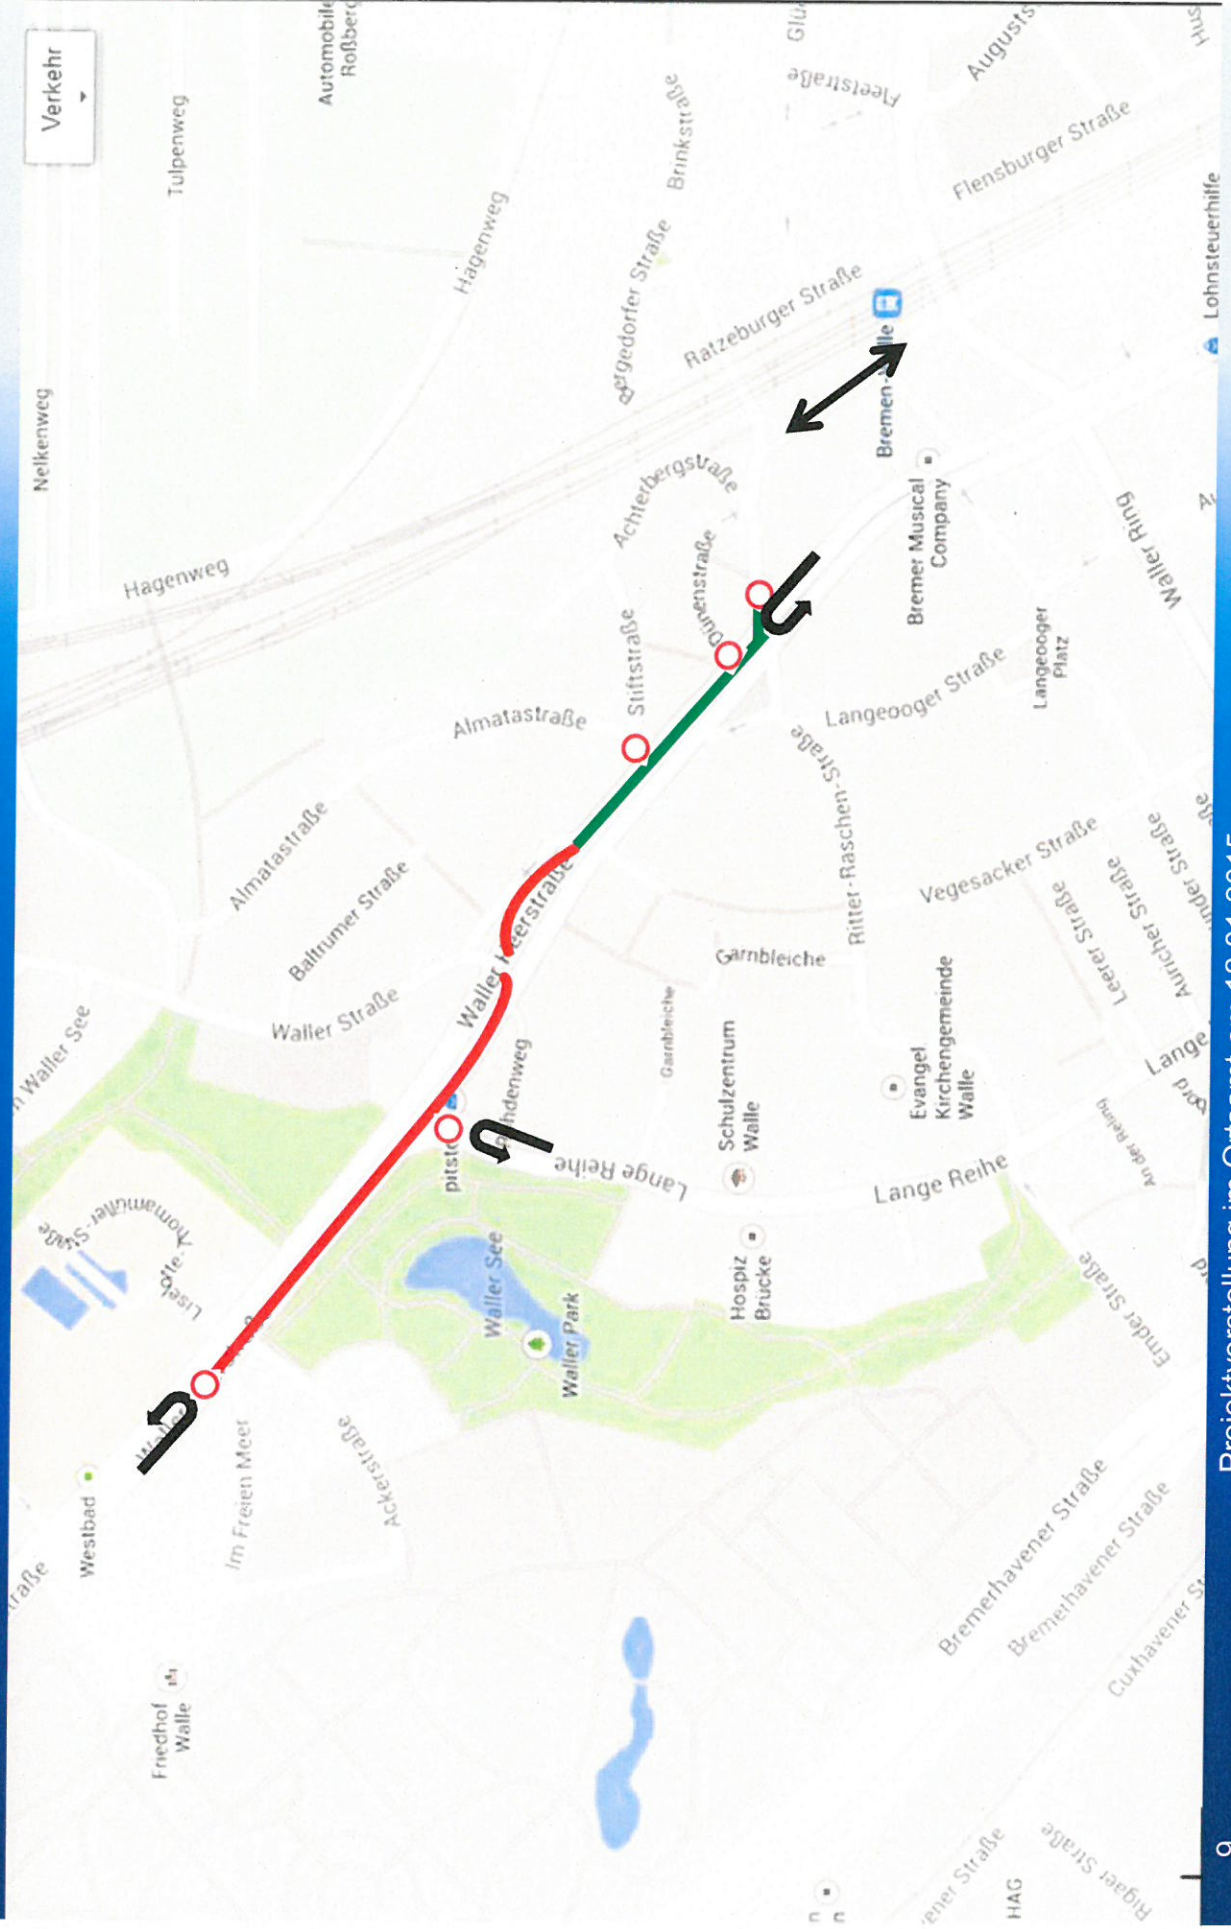

Verkehrslenkung 27.05.15. – 31.07.15 hanseWasser

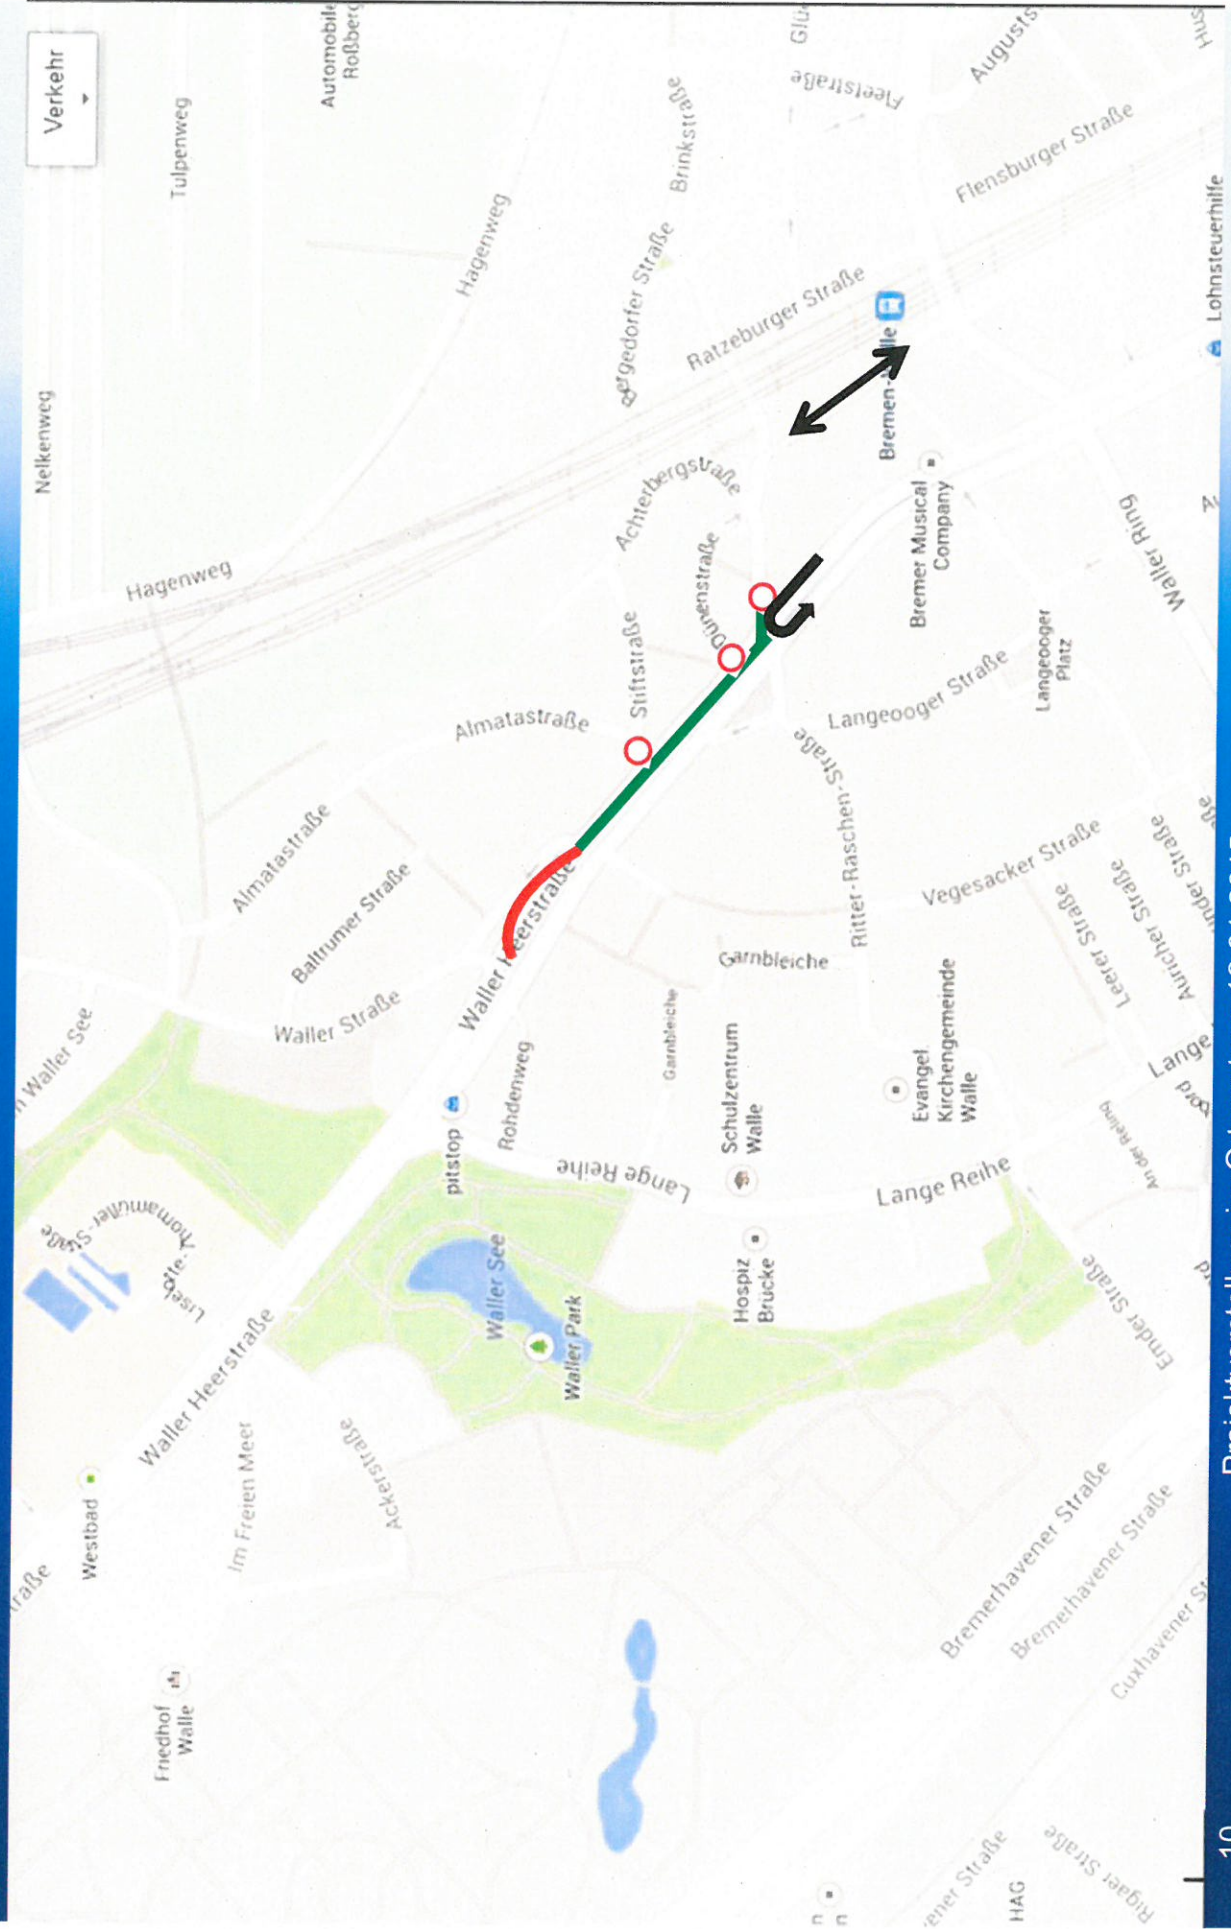

- Baustellenradar auf www.hansewasser.de mit Telefonnummern der Planer (und Bauleitungen)
- Projektvorstellung im Ortsamt West
- Direkte Information der Einzelhändler vor Ort
- Wurfsendung an alle Anwohner vor Baubeginn
- Presse kurz vor Baubeginn

